

Relatório Executivo: Migração e Segurança do NextERP (CDC)

Este documento foi elaborado em linguagem de negócios (não-técnica) para apresentar a diretores, gestores e partes interessadas os avanços, os riscos mitigados e os próximos passos da migração do sistema de estoque do NextERP da Google Cloud (GCP) para a Hostinger.




Sumário Executivo

- **O Projeto:** Estamos transferindo o sistema NextERP (estoque) da Google Cloud para a Hostinger para reduzir custos mensais e melhorar o desempenho.
 - **O Desafio:** O sistema antigo foi implementado sem documentação técnica, com integrações ocultas e senhas frágeis.
 - **O Resultado de Hoje:** Concluímos com sucesso a fase de testes em laboratório. Provamos que a nossa cópia de segurança (backup) funciona 100% e que o sistema está pronto para ser implantado na nova casa (Hostinger) com risco quase zero de perda de dados.
-

1. Etapa 1: A “Perícia” no Servidor Antigo (GCP)

Antes de mover o sistema, precisamos entender como ele foi construído pela equipe anterior. Foi realizada uma investigação detalhada no servidor antigo onde descobrimos:

- * **A “Fronteira” com Parceiros:** O sistema conversa de hora em hora com um sistema parceiro externo chamado **ONGSYS** para sincronizar produtos e requisições. Mapeamos essa conexão para garantir que ela não quebre na mudança.
- * **Rotinas Ocultas:** Descobrimos scripts automáticos que enviavam cópias de segurança (backups) para uma conta do Google Drive que pertencia ao desenvolvedor antigo, e não à CDC.

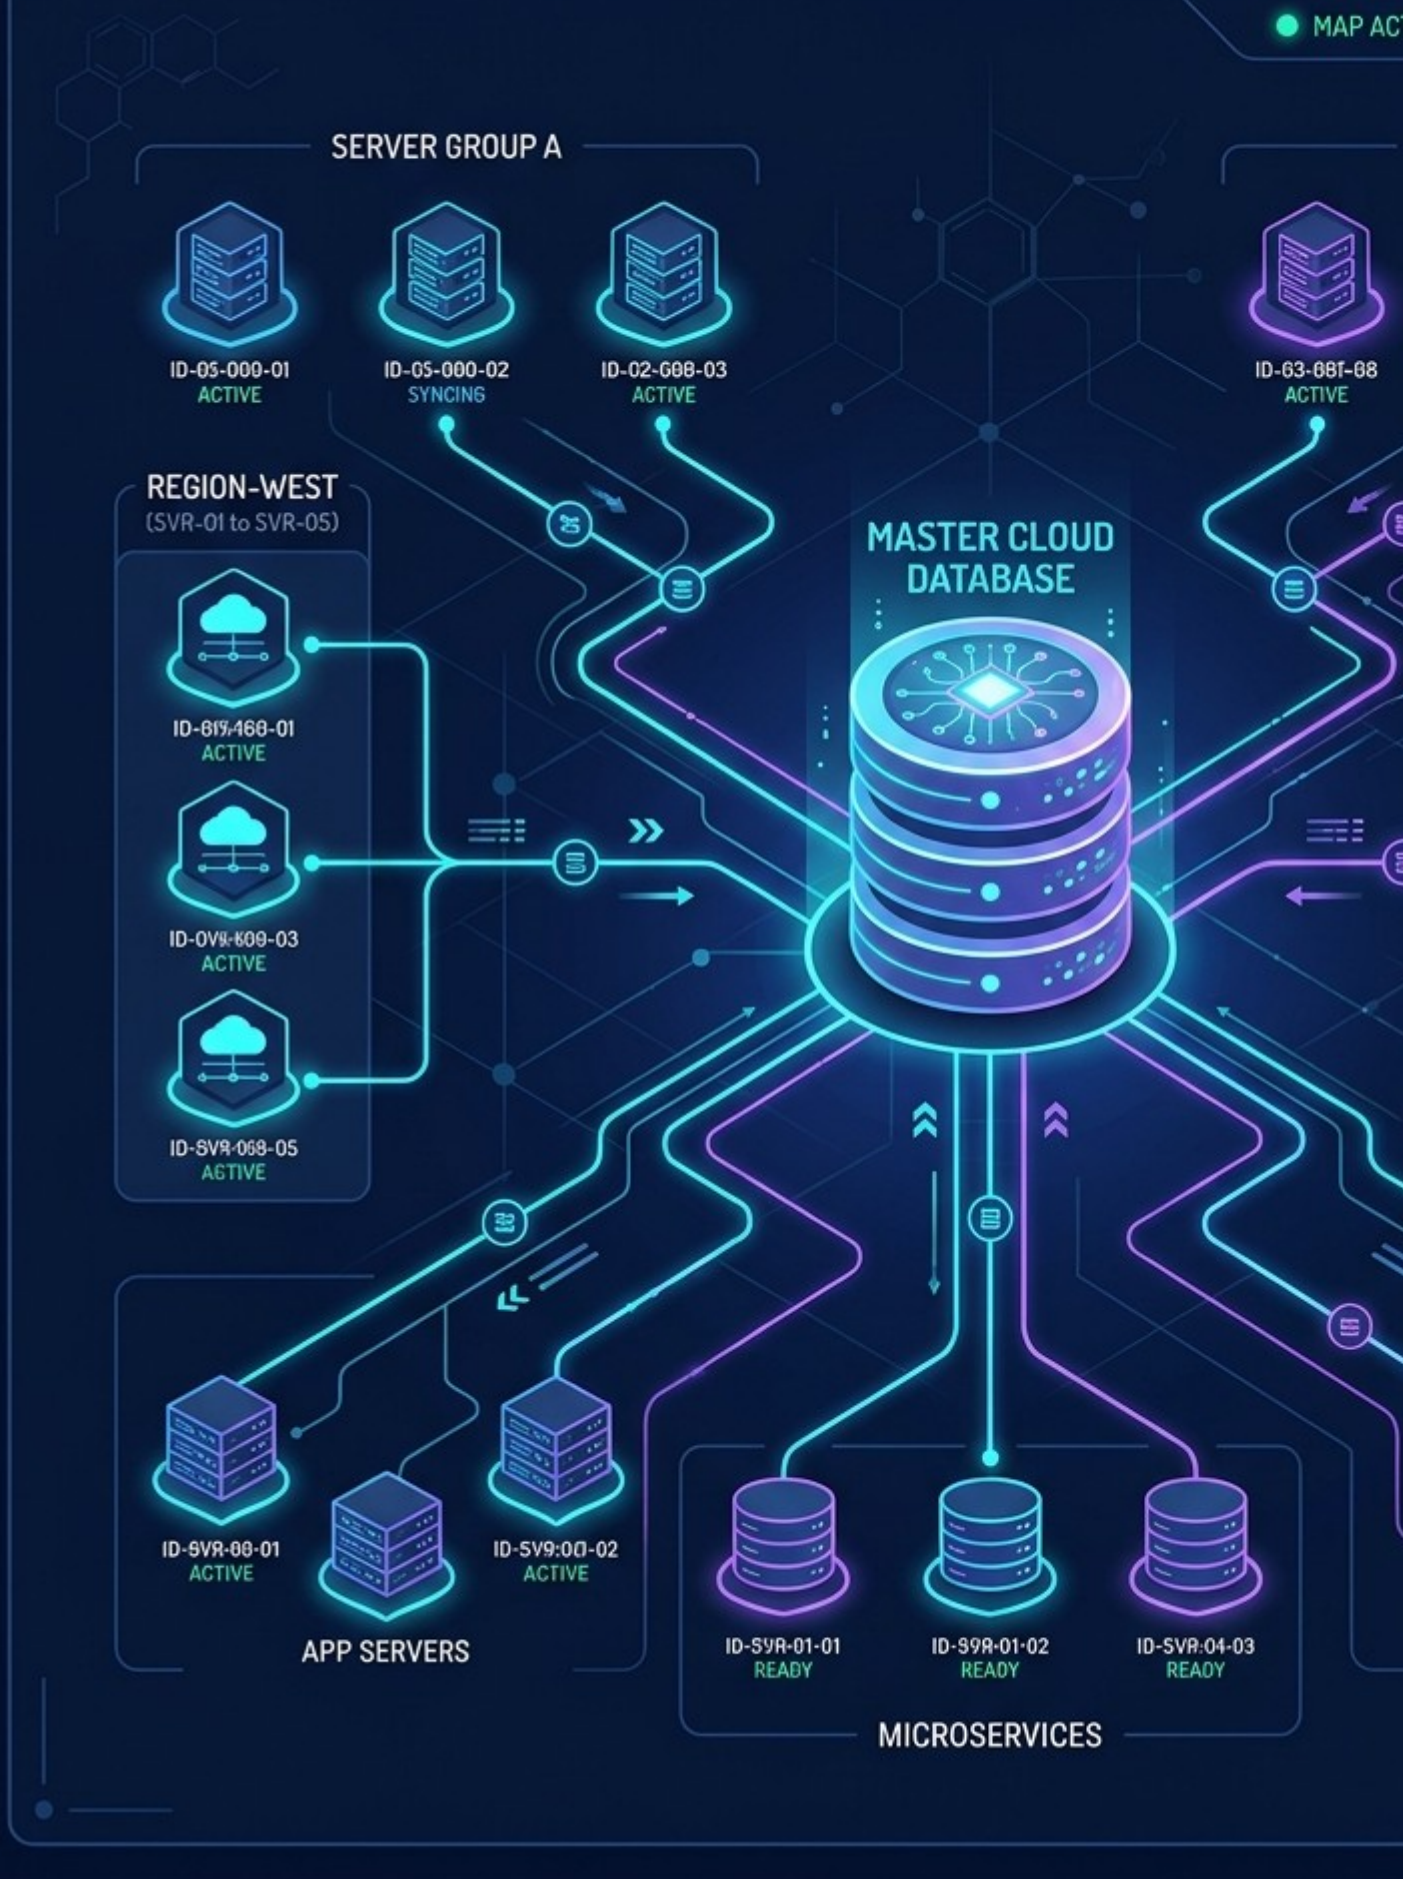

2. Etapa 2: A Cópia de Segurança (Backup)

Geramos uma cópia completa de todas as informações da CDC (banco de dados com as transações e todos os arquivos anexados por usuários). * **Nomeação Limpa:** Organizamos os arquivos com nomes simples e fáceis de ler (ex: Banco de Dados de Produção, Arquivos Públicos, etc.) para que qualquer membro futuro da TI da CDC saiba exatamente o que é cada arquivo.



Fase 2: Coleta de Backups e Arquivos

3. Etapa 3: O Laboratório de Testes (Simulação Local)

Para evitar que o sistema da empresa pare ou que percamos dados de estoque durante a migração, criamos um **ambiente de testes idêntico ao real** no computador local de desenvolvimento.

Durante essa simulação, encontramos e resolvemos 3 problemas que teriam derrubado o sistema se tivéssemos feito a migração direto na Hostinger: 1. **Conflito de Portas:** O sistema tentou usar uma porta de rede que já estava ocupada por outro aplicativo. Ajustamos o sistema para usar um canal livre. 2. **Arquivos Incompatíveis:** Os scripts copiados do servidor antigo continham links internos que só funcionavam no servidor antigo. Atualizamos e adaptamos esses arquivos. 3. **Senhas Desalinhadas:** Havia uma divergência entre a senha cadastrada no banco de dados e a senha de segurança do sistema, o que causava um erro de “Acesso Negado”. Sincronizamos as senhas e o acesso foi liberado.

Resultado do Teste: A integração com o ONGSYS rodou localmente e sincronizou **100% dos dados com sucesso**. Isso nos dá a garantia de que o backup está saudável.



Fase 3: Laboratório e Simulação Local

4. Por que esse processo é demorado e importante?

Garantir o funcionamento em um “Laboratório” antes de publicar o sistema oficial protege a CDC contra:

- * **Interrupção nas Operações (Downtime):** Evita que os funcionários fiquem parados sem conseguir registrar entradas e saídas de estoque.
- * **Perda de Informações:** Garante que nenhuma transação ou anexo seja apagado no processo.
- * **Refação:** Resolver problemas em ambiente de teste leva minutos; resolver problemas com o sistema em produção sob pressão de usuários parados pode levar horas ou dias.

5. O que falta fazer? (Cronograma da Virada Final)

A virada do sistema para a Hostinger será dividida em etapas planejadas para causar o menor impacto possível:

Etapas	O que será feito	Impacto na CDC
Preparação	Configurar o novo servidor da Hostinger e enviar os arquivos de teste.	Nenhum (sistema segue ativo no GCP)
Congelamento	Ativar o “modo manutenção” no sistema antigo (GCP) para que ninguém insira novos dados e extrair o banco de dados final atualizado.	Downtime Temporário (30 a 45 minutos fora do ar)
Ativação	Importar os dados finais na Hostinger e atualizar o domínio (estoque.cdc.org.br).	Fim do Downtime
Conclusão	Configurar os novos backups e os alertas de segurança.	Nenhum (sistema já ativo na Hostinger)

CLOUD DEPLOYMENT & FINAL



Fase 4: Implantação Hostinger e Virada Definitiva

6. Propostas de Melhoria Contínua (Próximos Passos de TI)

Após a migração, sugerimos implementar melhorias de governança na CDC: 1. **Central de Backups da CDC (Rclone)**: Configurar uma ferramenta profissional (Rclone) para enviar os backups de todos os sistemas da CDC (ERPNext, Moodle, etc.) para um **Drive Compartilhado oficial da empresa**, impedindo a perda de backups se um colaborador sair da equipe. 2. **Segurança de Senhas**: Substituir as senhas padrões expostas (como “admin”) por chaves criptográficas fortes e ocultas. 3. **Velocidade de Integração**: Otimizar o script de sincronização de produtos para rodar de forma mais veloz (atualmente ele leva 4 minutos por rodada).
